


### BUG类型

BUG类型	数量	BUG类型细分	数量
性能问题	0	数据越界	-
		数据类型	-
		逻辑问题	-
		版本兼容	-
		未知原因	-
代码逻辑	34	逻辑错误	34
		网络机制	-
接口相关	0	接口问题	-
		环境问题	-
		请求参数问题	-
完整性	0	考虑不全（数据联动）	0
		考虑不全（网络差）	0
		考虑不全（多用户）	0
		考虑不全（版本兼容）	0
		边界测试	0
		功能完整性	0
需求变更	0	需求文档没明确	2
		需求变动	4
用户体验	8	交互处理	0
		样式	2
		兼容性	6
其他	3	历史遗留	2
		特意设计	1
外因引起	6		6

- 性能问题
- 代码逻辑
- 接口相关
- 完整性
- 需求变更
- 用户体验
- 其他
- 外因引起

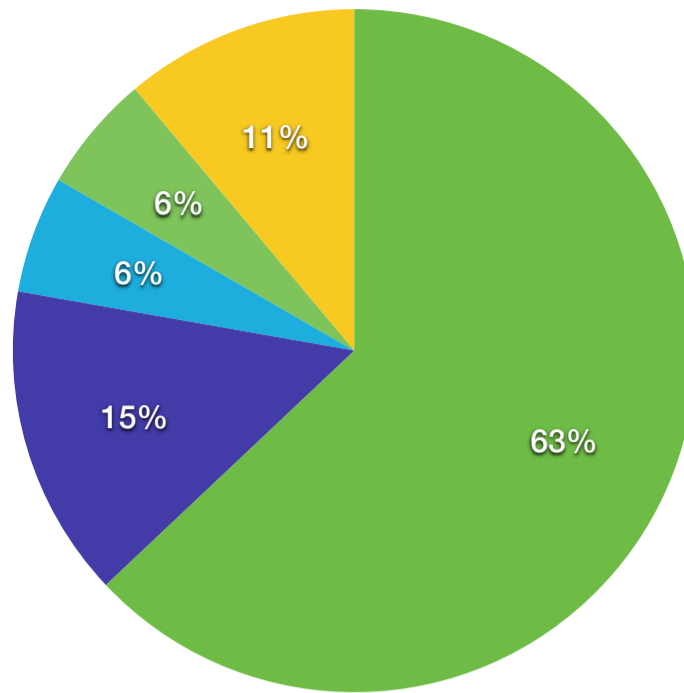

### 日均bug产生率

姓名	有效工作日	IOS 开发的BUG总数	BUG数/工作人日
卢德智	20	14	0.7
黄永坤	20	28	1.4
总人日	40	42	1.05

### 上线一周crash情况

日期	CRASH数	CRASH率
2017-07-05	1	0.005
2017-07-06	0	0
2017-07-07	0	0
2017-07-08	1	0.0004
2017-07-09	0	0

日期	CRASH数	CRASH率
2017-07-10	2	0.0006
2017-07-11	0	0

## 项目总结

姓名	总结
卢德智	<p>这个版本主要负责设计师、整屋案例、居住升级、话题等多个模块的改版需求；时间上比较紧张，开发中存在居住升级首页多滑动视图联动交互难点问题，项目按时完成。</p> <p>APP开发质量不够理想，总结原因如下：  1、多处的样式改版在需求总并没有体现出来，未能准确评估时间，导致开发时间紧张；  2、测试不够充分，出现多个兼容性以及样式问题；  3、联调时间不够，未能及时发现接口问题。</p> <p>计划改进：  1、期望产品表明需要做样式修改的页面、视图以及特殊交互注明在原型文档中；  2、加强兼容测试，排期尽可能保证联调时间。</p>
黄永坤	<p>这次项目的风险把控做得不好，导致项目的开发进度不能按原计划顺利进行；另外，存在很多细节上的问题，而引发很多bug，例如：接口需求文档做的不够详细，没有说明后端接口需要返回的数据结果、类型、字段名等等，导致一些可以通用的模块功能不能直接使用，需要做一次数据转换，到项目开发的最后的时间段里，有很多地方忘记了做数据转换，而引发很多不应该有的bug。</p>
