




BUG 类型			
bug 类型	数量 (20)	bug 类型细分	数量
性能问题			
		数组越界	
		数据类型	
		逻辑问题	
		版本兼容	
		未知原因	
代码逻辑	9		
		逻辑错误	8
		网络机制	1
接口相关	2		
		接口问题	1
		环境问题	
		请求参数问题	1
完整性			
		考虑不全(数据联动)	
		考虑不全(网络差)	
		考虑不全(多用户)	
		考虑不全(版本兼容)	
		边界测试	
需求变更	6		
		需求文档没明确	4
		需求文档变更	1
		新增需求	1
用户体验	3		
		交互处理	1
		样式	2
		兼容性	
其他			
		未知原因	
		数据调整	
外部系统			
历史遗留			

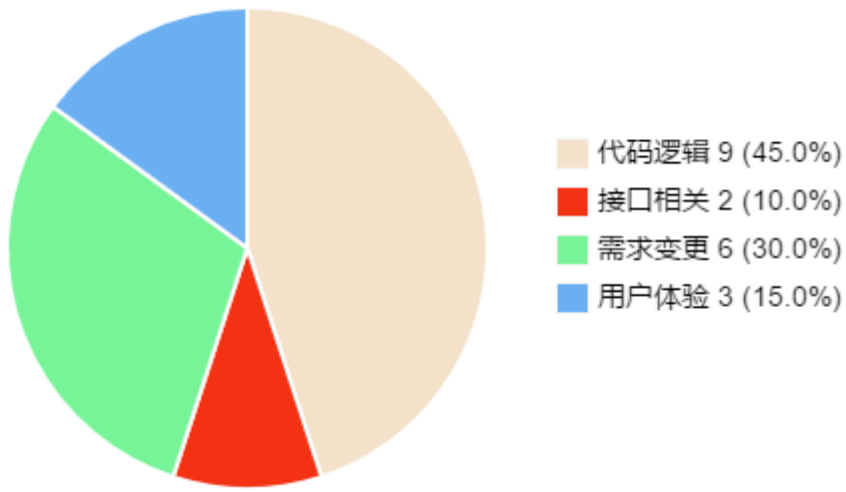


(代码逻辑) 类型细分	
Bug 类型	数量
逻辑错误	8
网络机制	1

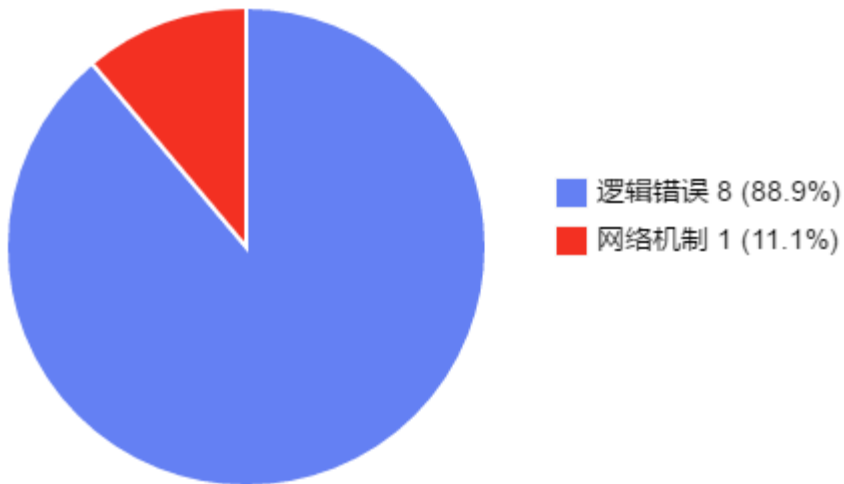

(接口相关)类型细分	
Bug 类型	数量
接口问题	1
请求参数问题	1

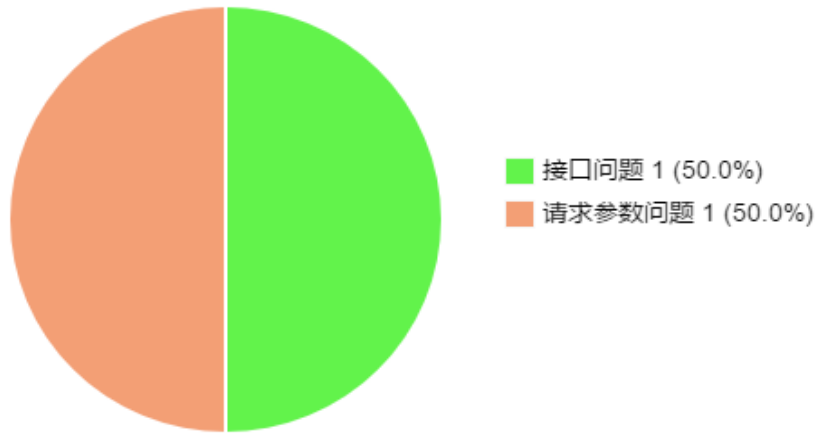

(用户体验)类型细分	
Bug 类型	数量
交互处理	1
样式	2

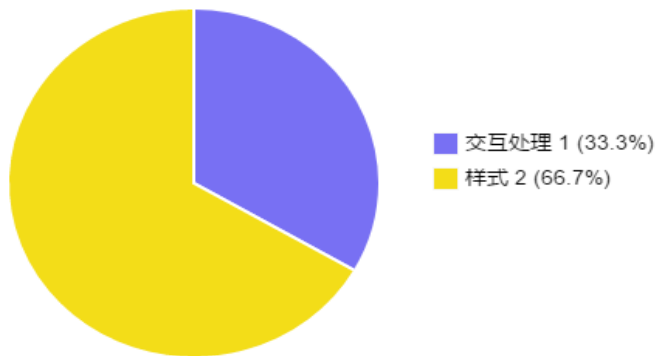

组员日均 bug 产生率			
组员	有效工作日	bug 总数	bug 数/工作人日
邓宇荣	30	14	0.47

bug 激活情况			
bugID	激活次数	类型	所属
90072	1	Mrobot	邓宇荣
90040	1	Mrobot	邓宇荣

各组员 bug 激活率		
姓名	bug 激活数	bug 激活数/修复 bug 总数
邓宇荣		20.1

项目总结	
邓宇荣	<p>1. 有一半 bug 是代码逻辑引起，这些问题都可以在接口开发阶段避免的。一方面是不够仔细，考虑不全；另一方面是开发时间紧迫，一批接口开发完后就要送测了，同时进行第二批接口的开发，没有安排足够的时间自测和联调。下次谈需求的时候注意一下排期的问题，实在不够时间要提出来，态度强硬点。</p> <p>2. 有几个需求不明确或者新增的需求，是测试阶段 qa 和产品提出的，改动量不大，是可以配合修改的。</p> <p>3. wap 页样式问题涉及到前端，mrobot 配合修改。有些样式问题在接口测试阶段浏览器上看是没问题的，放到 app 上测试就出现了。</p> <p>4. 长图文话题详情页的评论时间，开发阶段是按照以前全部评论页那样需求后端直接返回时间字符串的，如“10-31 12:00”，但是跟 app 冲突了，app 需要取时间戳。这里没有统一好。</p> <p>5. 测试过程中，出现后端接口修改了某个接口，只通知了安卓和 mrobot，但是没有拉上 iOS，导致 iOS 出错。已与开发同事协商好以后有改动都需要通知各方。</p>
